Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			***Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso con QR y reservas de áreas sociales de una urbanización privada***			
2			**0. Anteproyecto**	**11 días?**	**lun 9/3/26**	**lun 23/3/26**
3			0.1 Presentación del anteproyecto	1 día	lun 9/3/26	lun 9/3/26
4			0.2 Aprobación del anteproyecto	10 días	mar 10/3/26	lun 23/3/26
5			**1. Planificación del proyecto**	**3 días?**	**lun 13/4/26**	**mié 15/4/26**
6			1.1 Elaboración del cronograma	1 día	lun 13/4/26	lun 13/4/26
7			1.2 Definir el alcance del proyecto	1 día	mar 14/4/26	mar 14/4/26
8			1.3 Definir metodología del proyecto	1 día	mié 15/4/26	mié 15/4/26
9			**2. Investigación y análisis**	**4 días?**	**mar 21/4/26**	**vie 24/4/26**
10			2.1 Definir el planteamiento del problema	1 día	mar 21/4/26	mar 21/4/26
11			2.2 Definir los objetivos del proyecto	1 día	mié 22/4/26	mié 22/4/26
12			2.3 Elaborar justificación e importancia	1 día	jue 23/4/26	jue 23/4/26
13			2.4 Definir el alcance y delimitación	1 día	vie 24/4/26	vie 24/4/26
14			**3. Metodología de investigación**	**10 días?**	**lun 27/4/26**	**vie 8/5/26**
15			3.1 Definir el tipo de investigación	1 día	lun 27/4/26	lun 27/4/26
16			3.2 Definir la población y muestra	1 día	mar 28/4/26	mar 28/4/26
17			3.3 Diseñar encuestas y entrevistas	1 día	mié 29/4/26	mié 29/4/26
18			3.4 Aplicar los instrumentos de recolección de datos	1 día	mar 5/5/26	mar 5/5/26
19			3.5 Analizar datos estadísticos	1 día	vie 8/5/26	vie 8/5/26
20			**4. Diseño del sistema**	**14 días?**	**lun 11/5/26**	**jue 28/5/26**
21			4.1 Diseñar prototipo de UX/UI	2 días	lun 11/5/26	mar 12/5/26
22			4.2 Validar diseño de usuario	1 día	mié 13/5/26	mié 13/5/26



Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
23			4.3 Diseñar arquitectura del sistema	2 días	jue 14/5/26	vie 15/5/26
24			4.4 Diseña base de datos	3 días	lun 18/5/26	mié 20/5/26
25			4.5 Diseñar interfaz de usuario	3 días	jue 21/5/26	lun 25/5/26
26			4.6 Elaborar diagramas del sistema	3 días	mar 26/5/26	jue 28/5/26
27			**5. Desarrollo del sistema**	**15 días?**	**vie 29/5/26**	**jue 18/6/26**
28			5.1 Configurar el entorno de desarrollo	2 días	vie 29/5/26	lun 1/6/26
29			5.2 Desarrollar módulo de usuario	3 días	mar 2/6/26	jue 4/6/26
30			5.3 Desarrollar módulo de pagos	2 días	vie 5/6/26	lun 8/6/26
31			5.4 Desarrollar módulo de control de acceso	3 días	mar 9/6/26	jue 11/6/26
32			5.5 Desarrollar módulos de reservaciones	2 días	vie 12/6/26	lun 15/6/26
33			5.6 Integración de los módulos	3 días	mar 16/6/26	jue 18/6/26
34			**6. Pruebas y validación**	**6 días?**	**vie 19/6/26**	**vie 26/6/26**
35			6.1 Realizar pruebas funcionales	2 días	vie 19/6/26	lun 22/6/26
36			6.2 Validación con juicios de expertos	2 días	mar 23/6/26	mié 24/6/26
37			6.3 Corrección de errores	2 días	jue 25/6/26	vie 26/6/26
38			**7. Documentación del proyecto**	**10 días?**	**lun 29/6/26**	**vie 10/7/26**
39			7.1 Redactar Capítulo I: Planteamiento del problema	2 días	lun 29/6/26	mar 30/6/26
40			7.2 Redactar Capítulo II: Marco teórico	2 días	mié 1/7/26	jue 2/7/26
41			7.3 Redactar Capítulo III: Propuesta tecnológica	2 días	vie 3/7/26	lun 6/7/26
42			7.4 Redactar Capitulo IV: Conclusiones y recomendaciones	2 días	mar 7/7/26	mié 8/7/26
43			7.5 Elaborar manual técnico	1 día	jue 9/7/26	jue 9/7/26
44			7.6 Elaborar manual de usuario	1 día	jue 9/7/26	jue 9/7/26
45			7.7 Revisión final del documento	1 día	vie 10/7/26	vie 10/7/26



Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
46			**8. Cierre del proyecto**	28 días	lun 13/7/26	mié 19/8/26
47			8.1 Presentación y finalización del proyecto (tutorías)	5 días	lun 13/7/26	vie 17/7/26
48			8.2 Revisión del trabajo de titulación	5 días	mié 29/7/26	mar 4/8/26
49			8.3 Sustentación del trabajo de titulación	7 días	mar 11/8/26	mié 19/8/26

9 mar '26

D L M X J V S D

Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

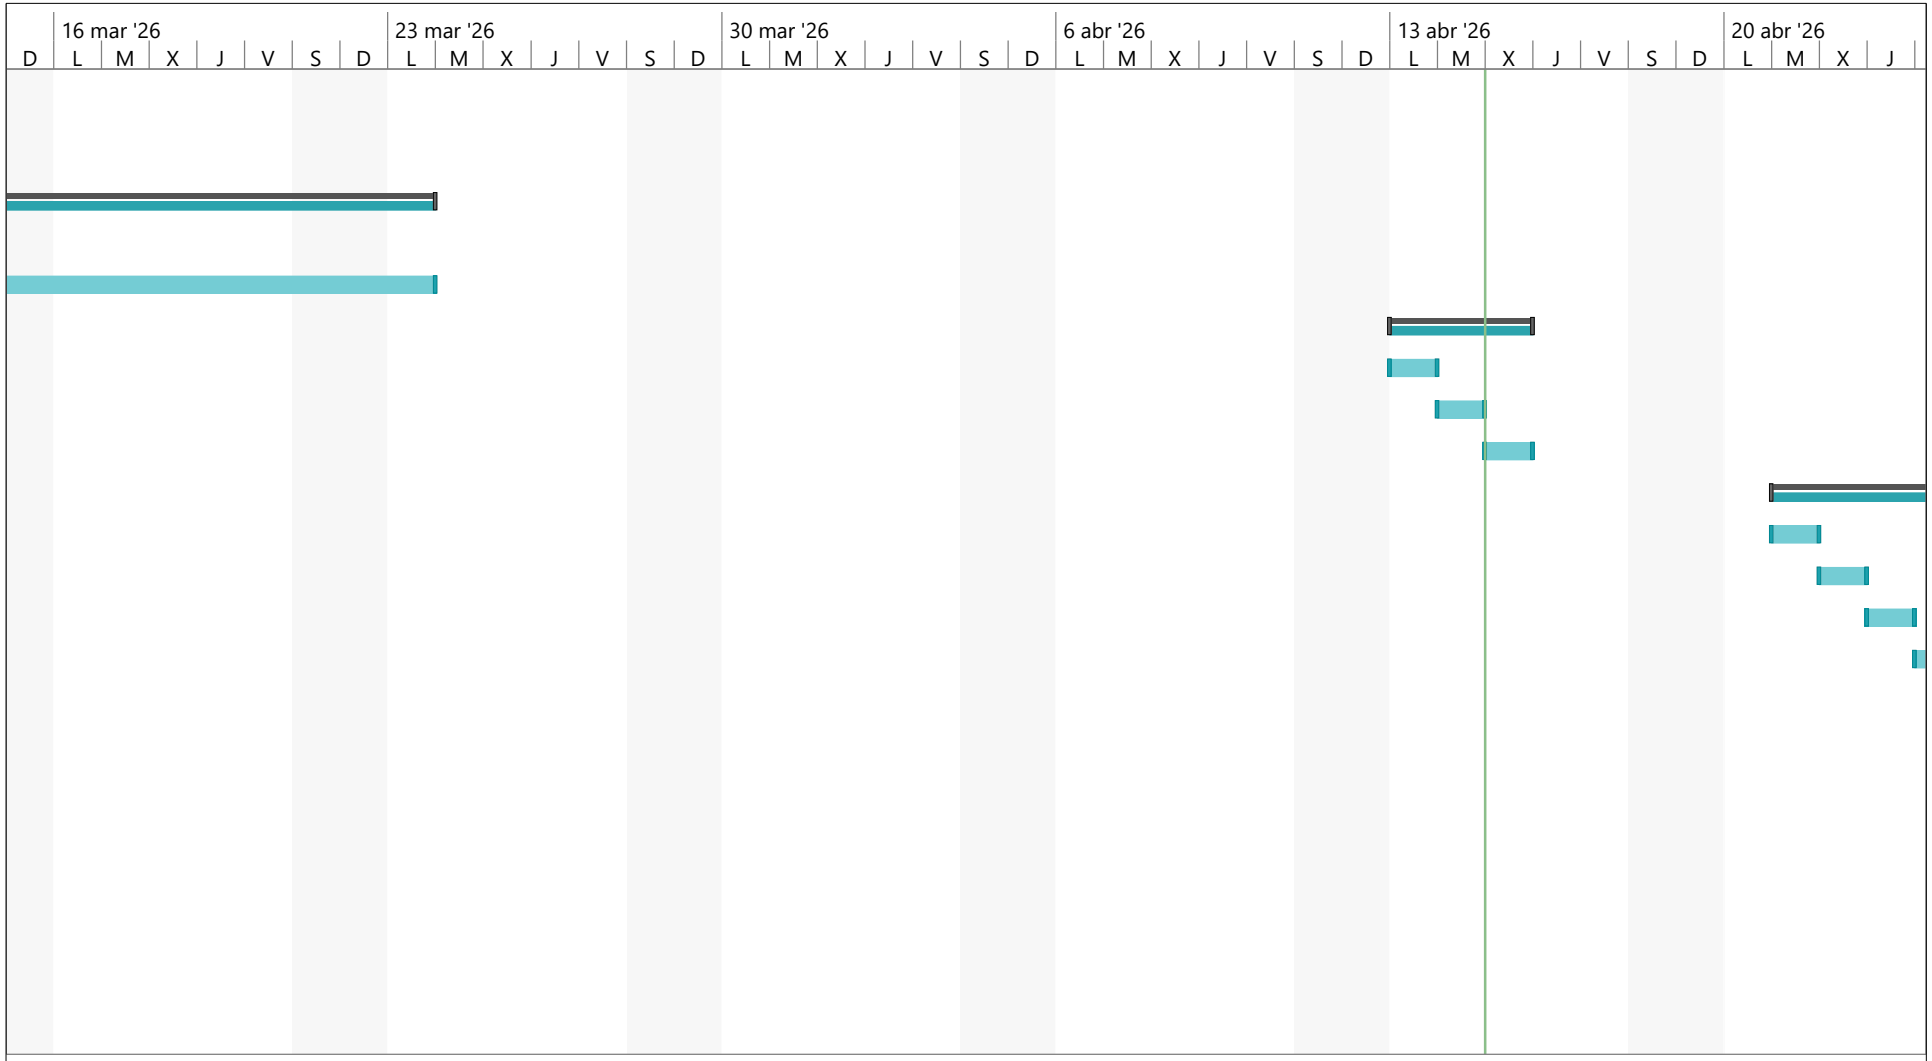

Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

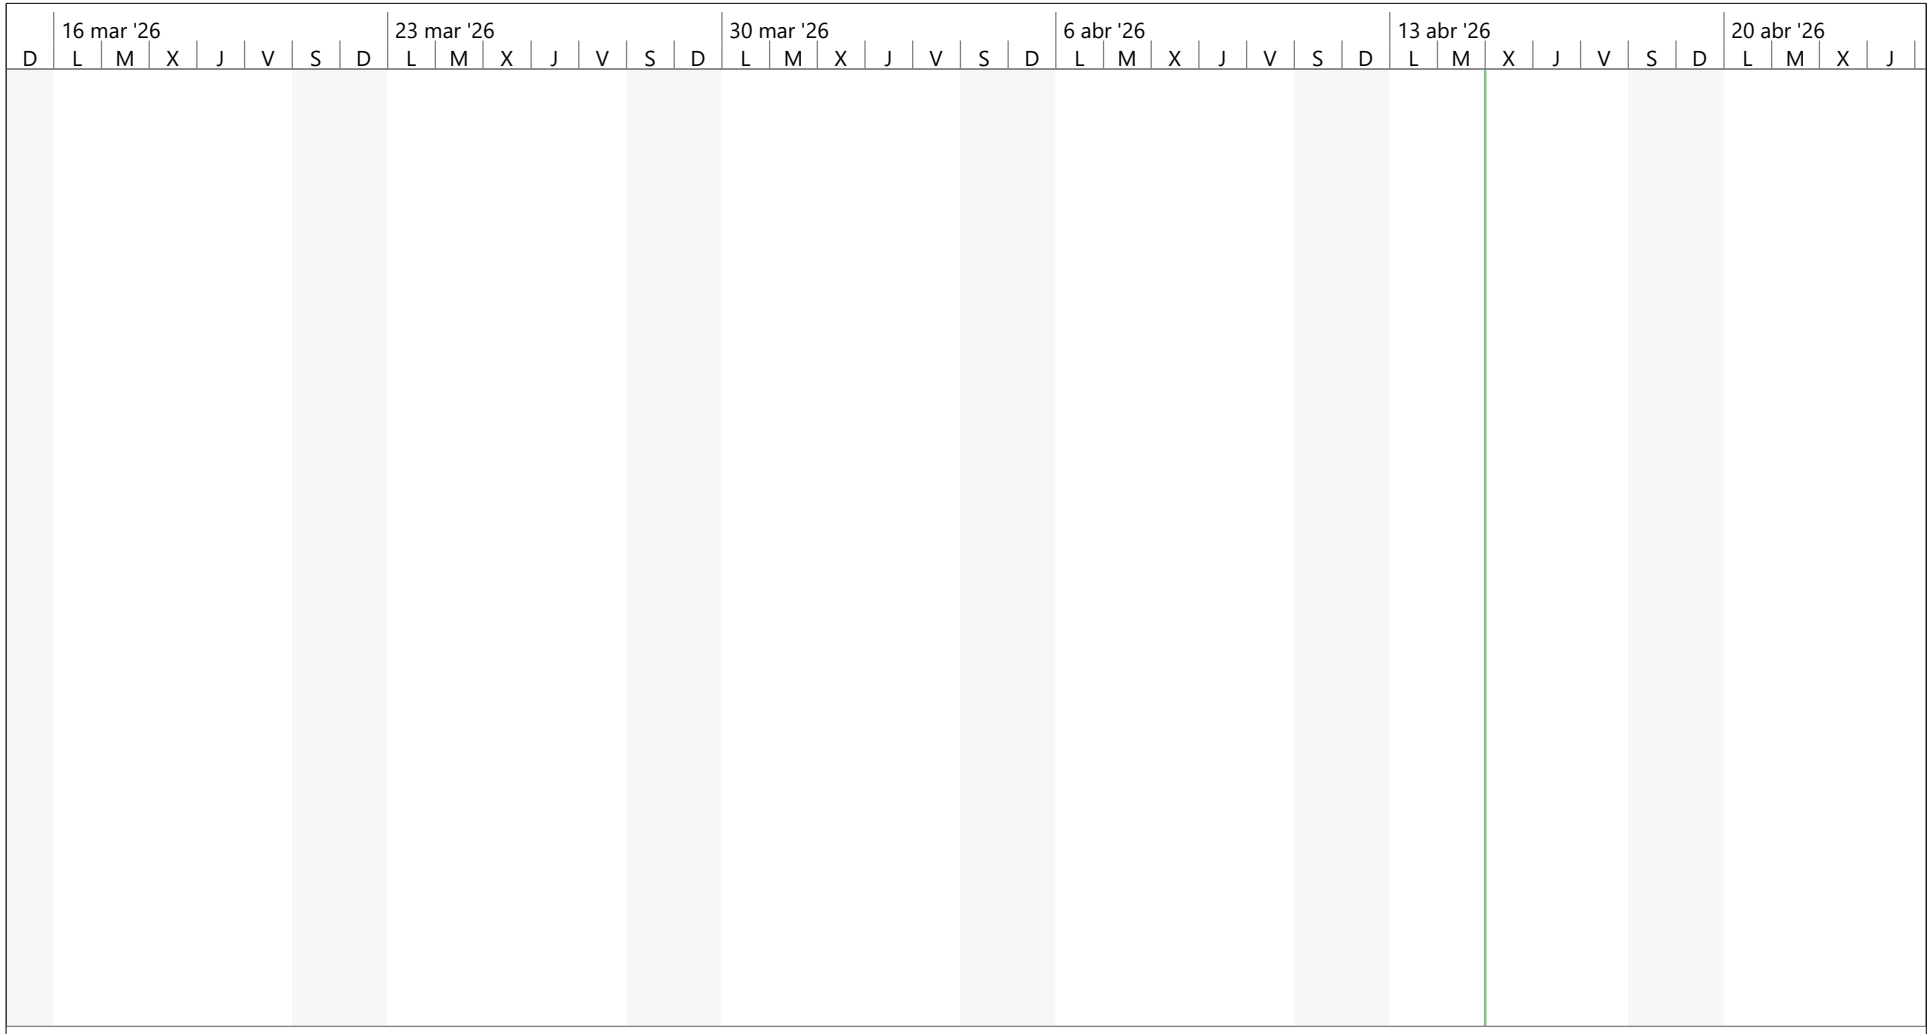

Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

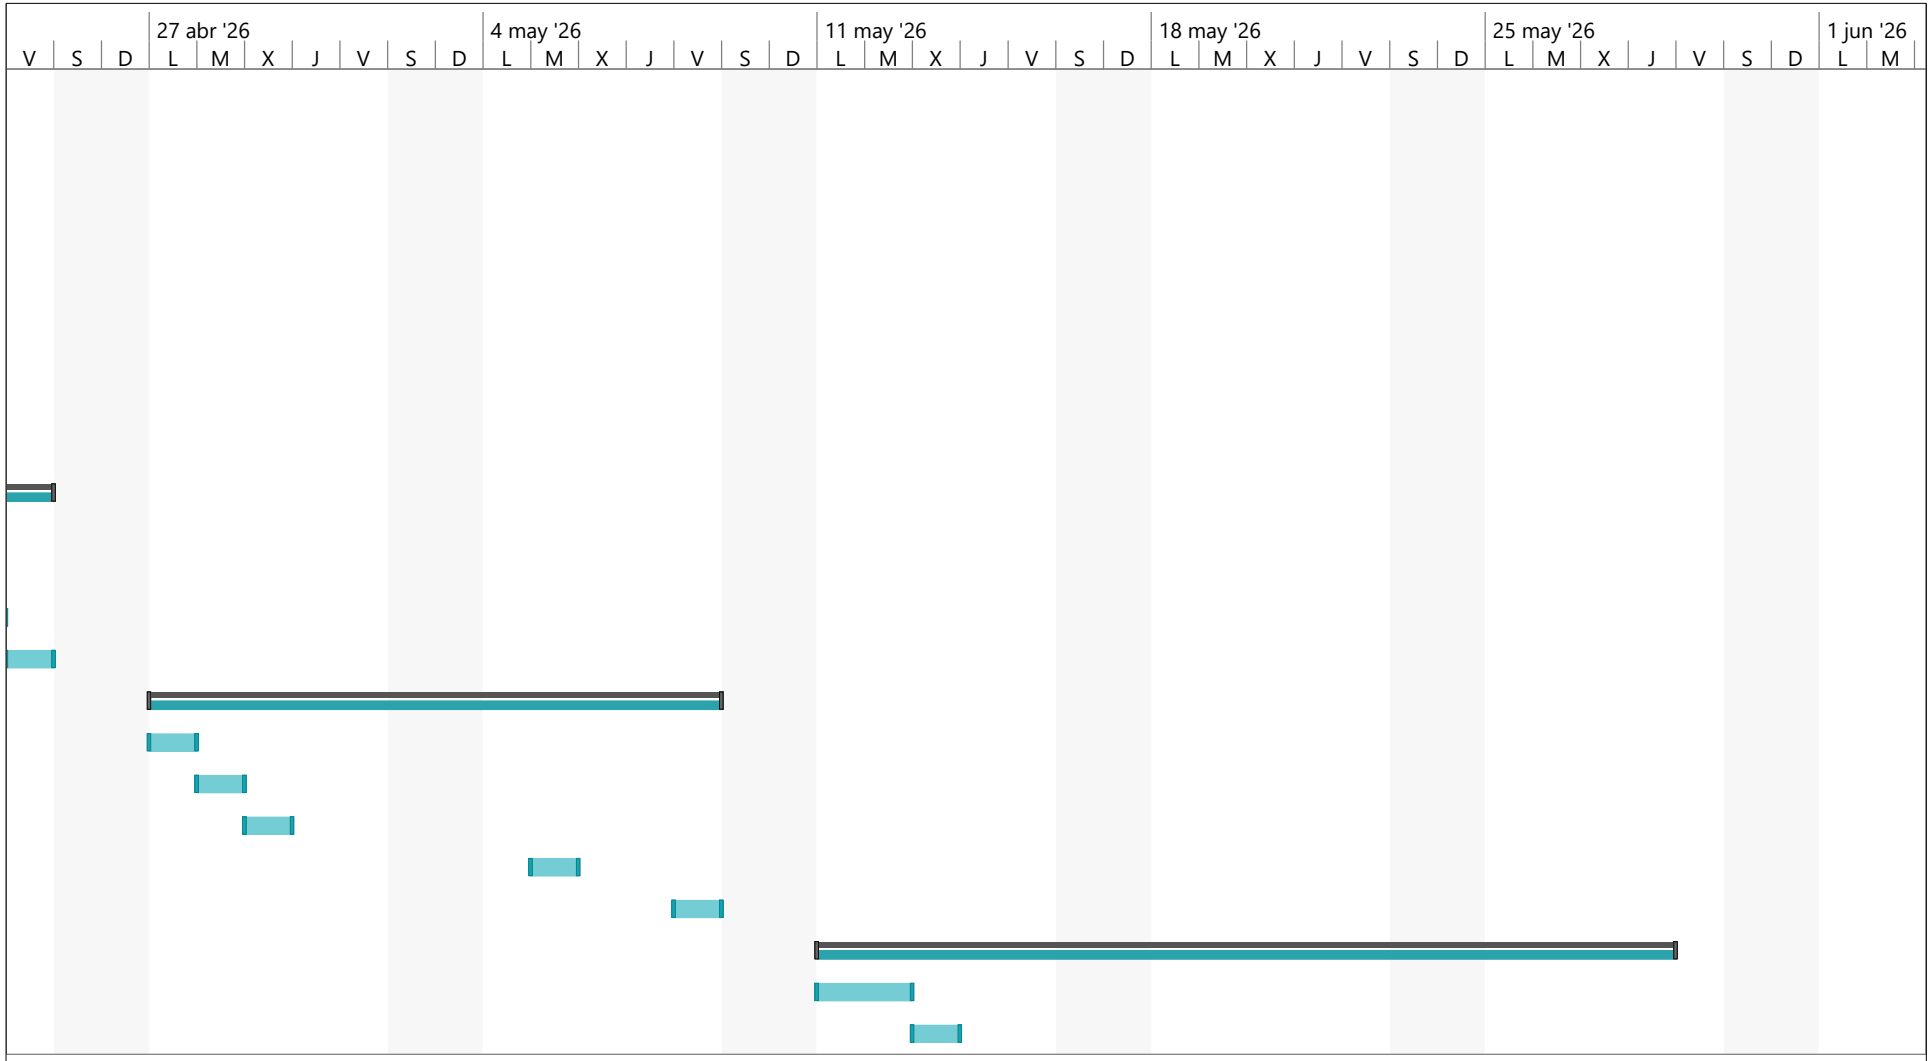

Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

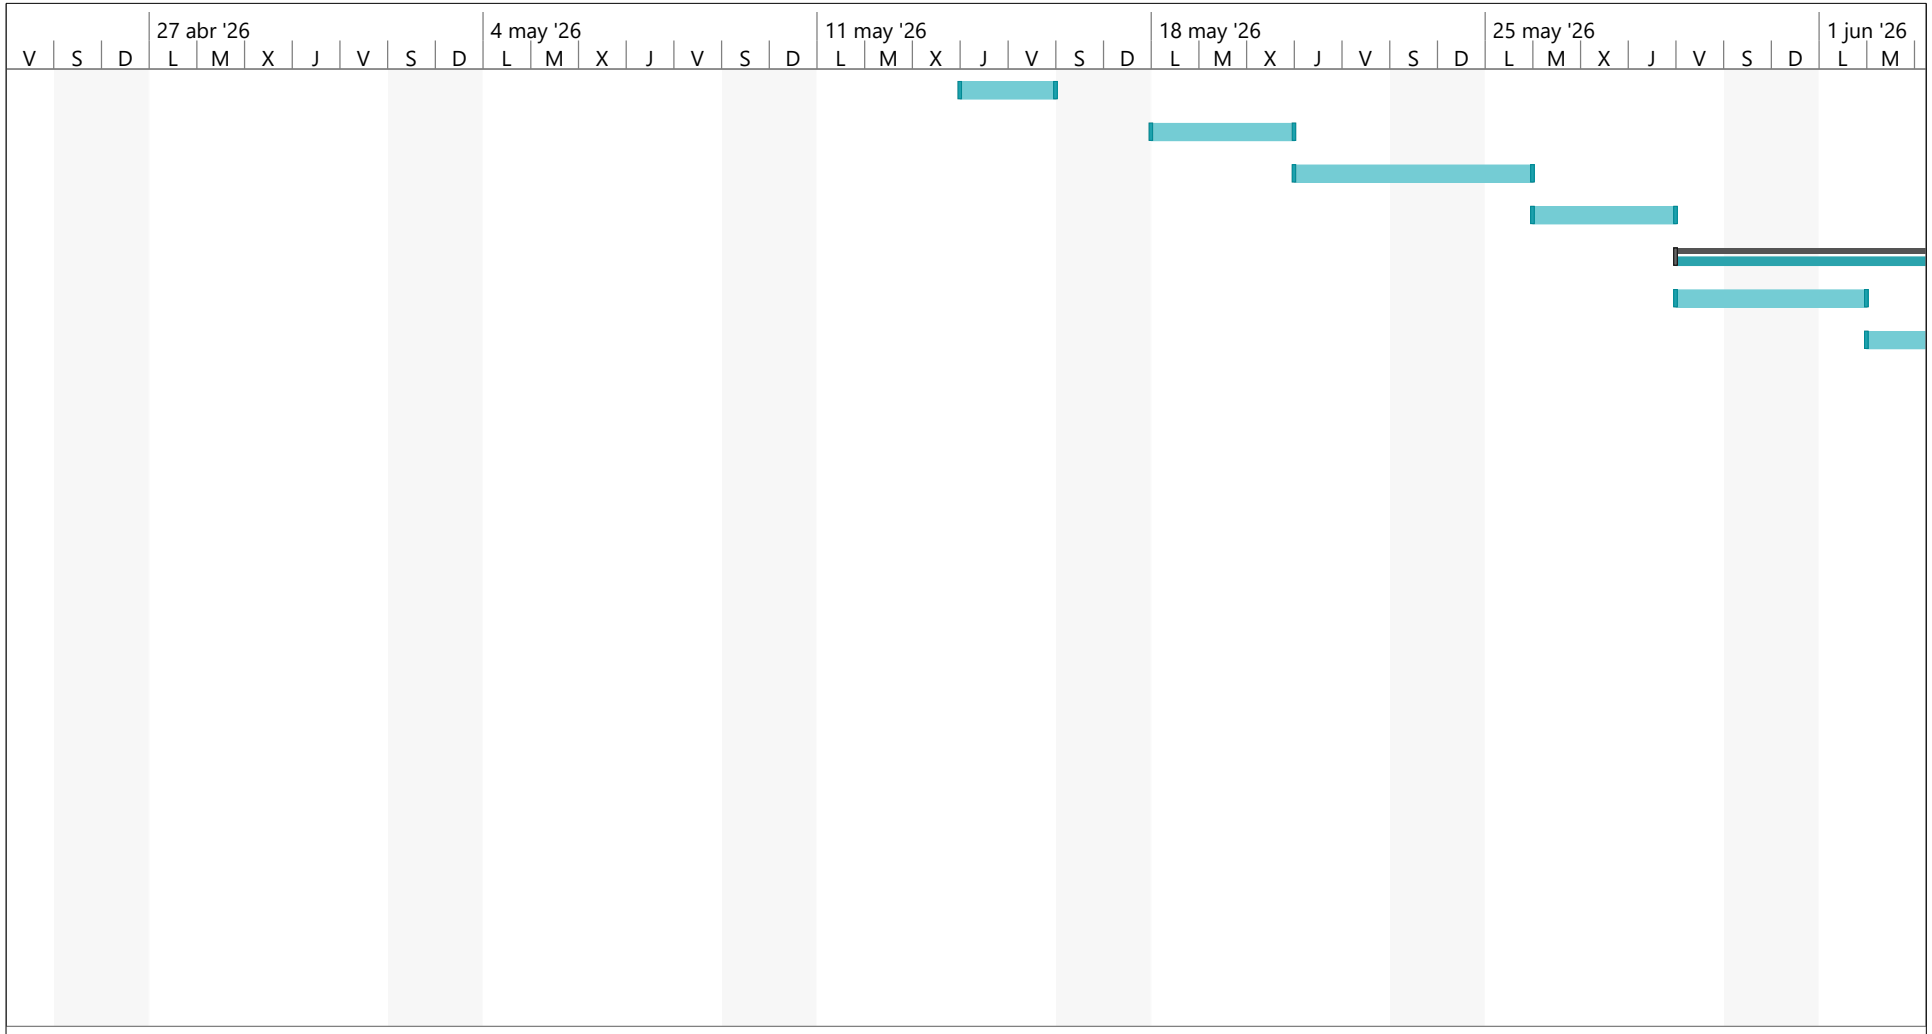

Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

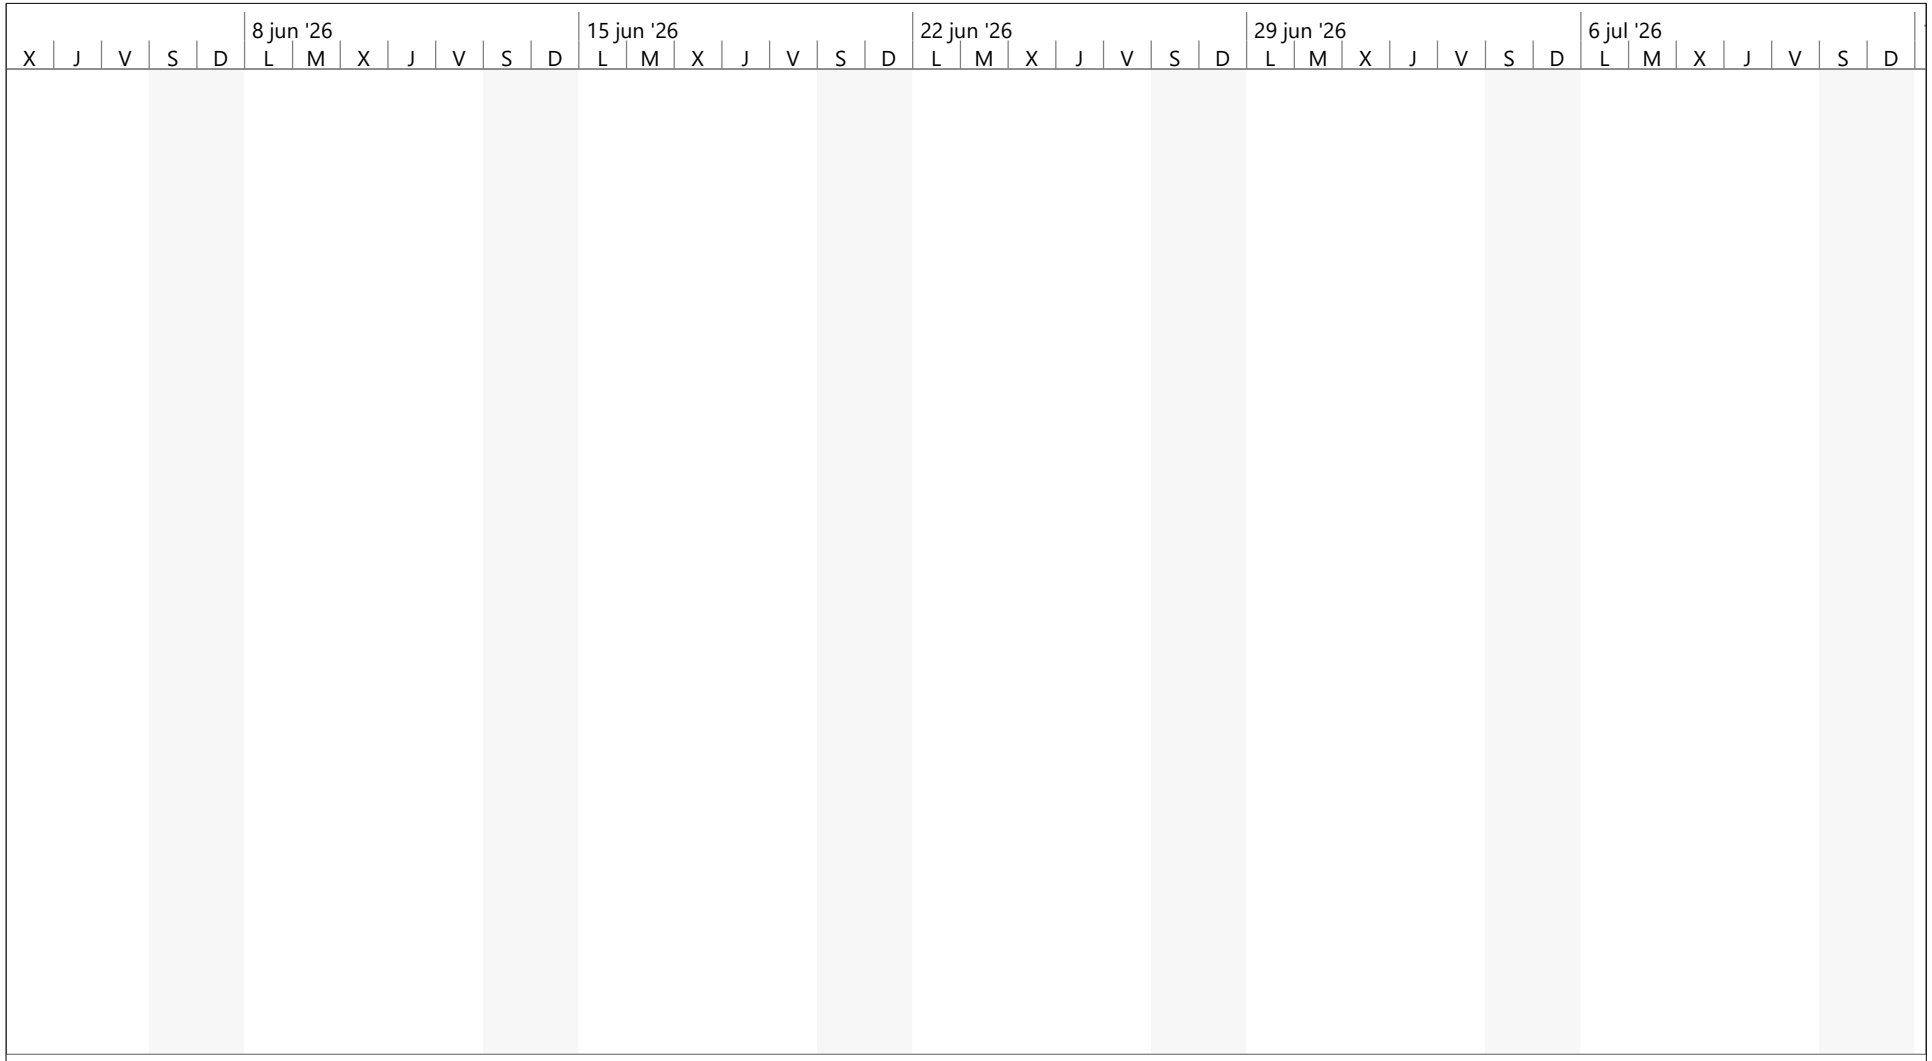

Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

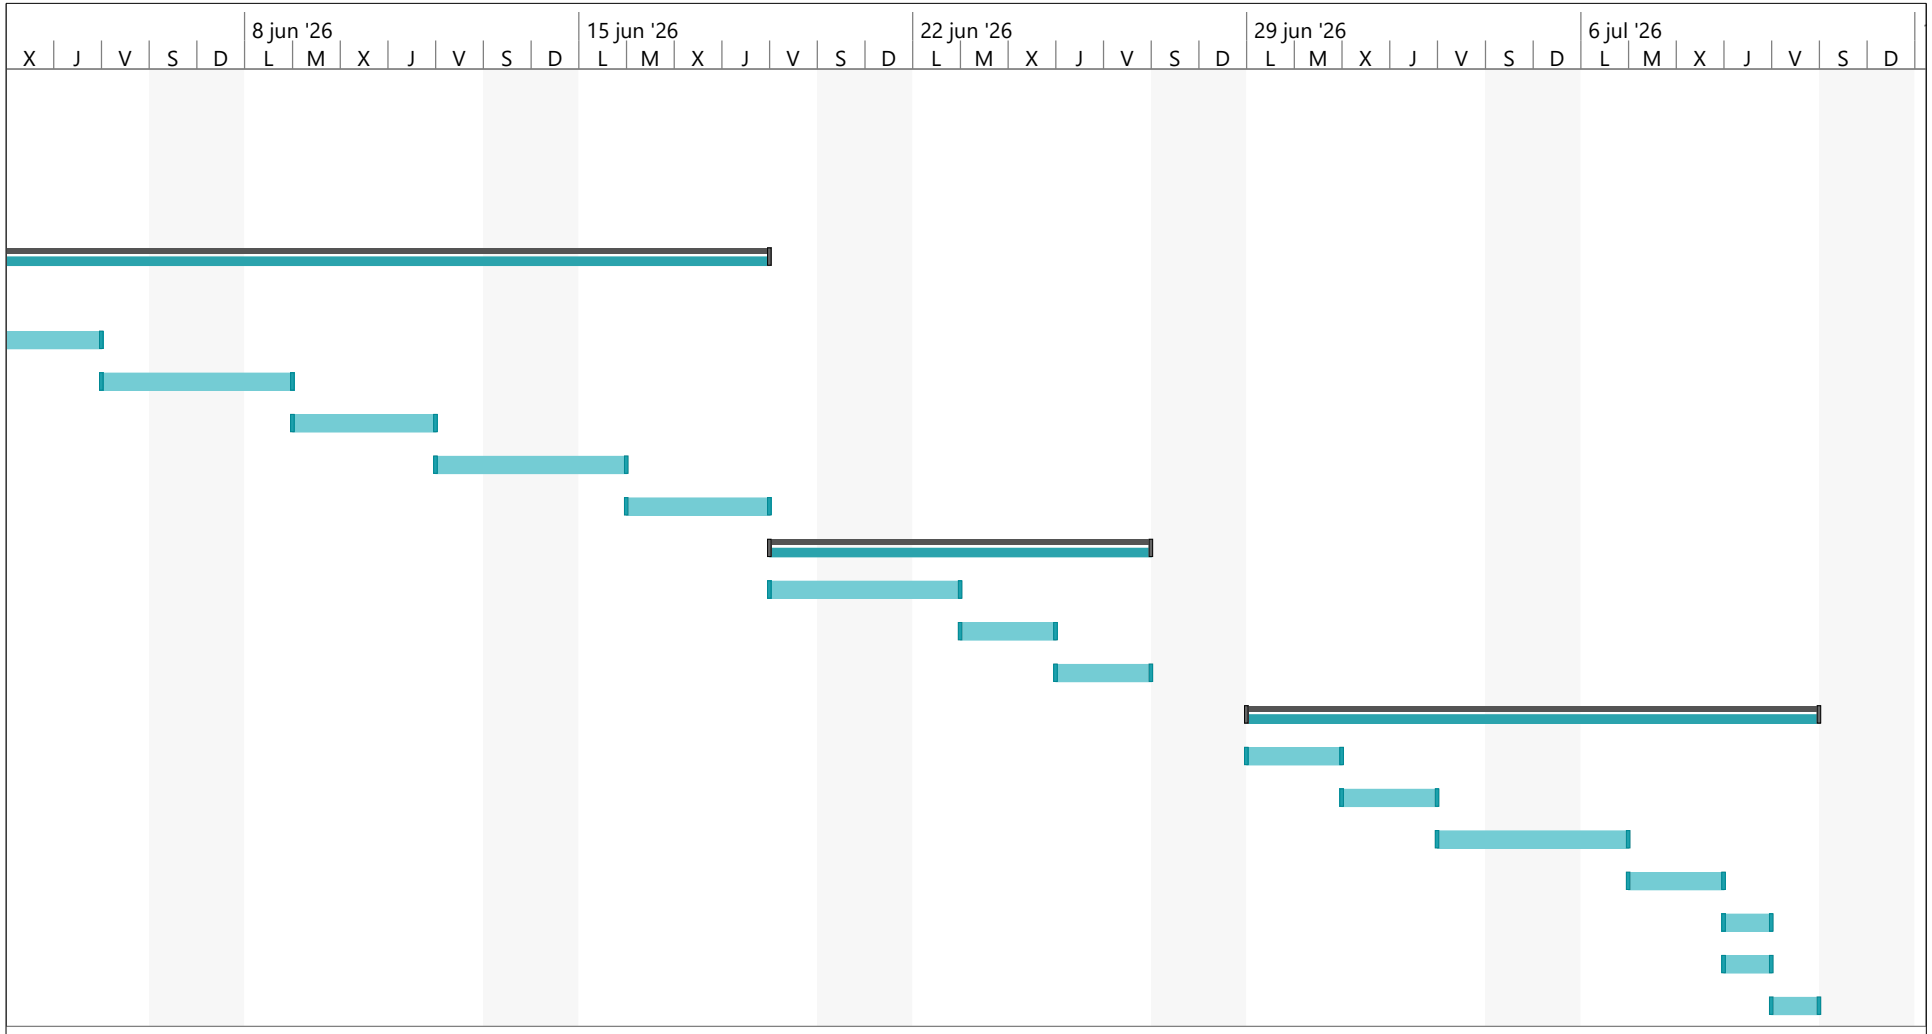

Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

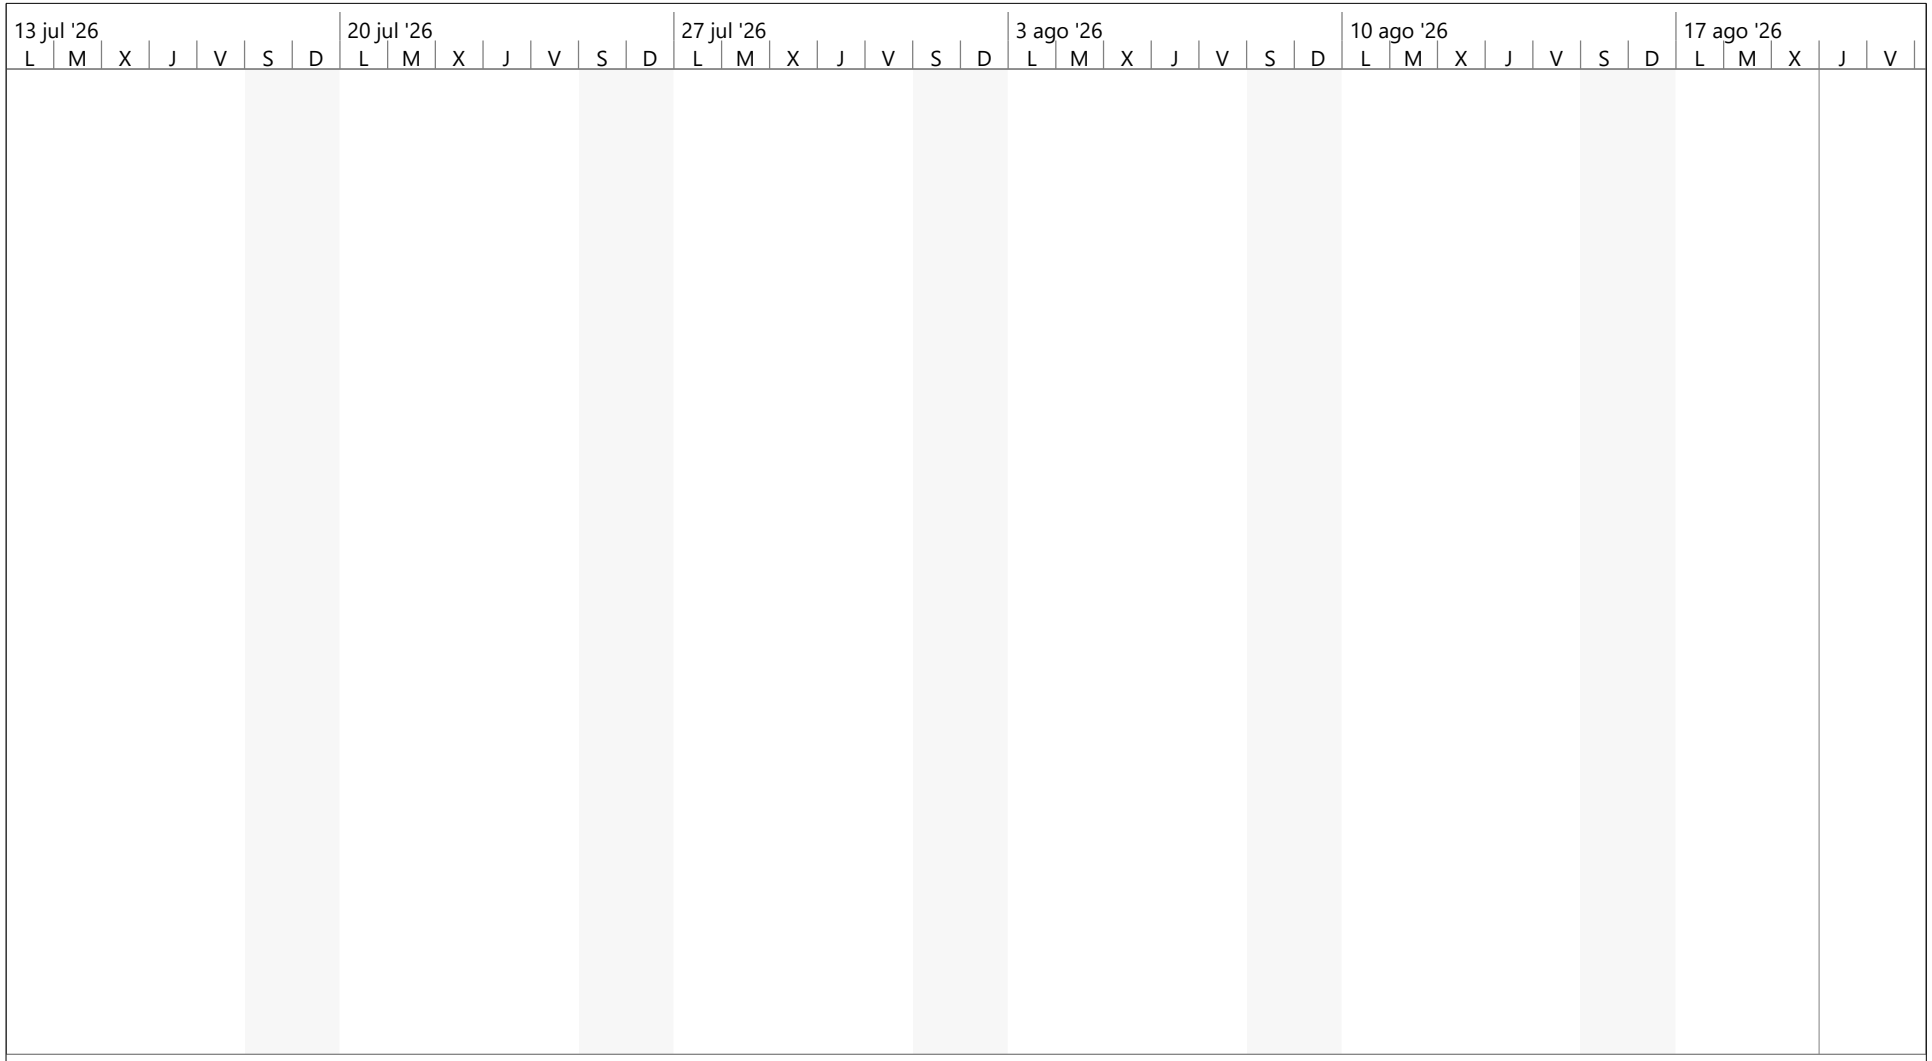

Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

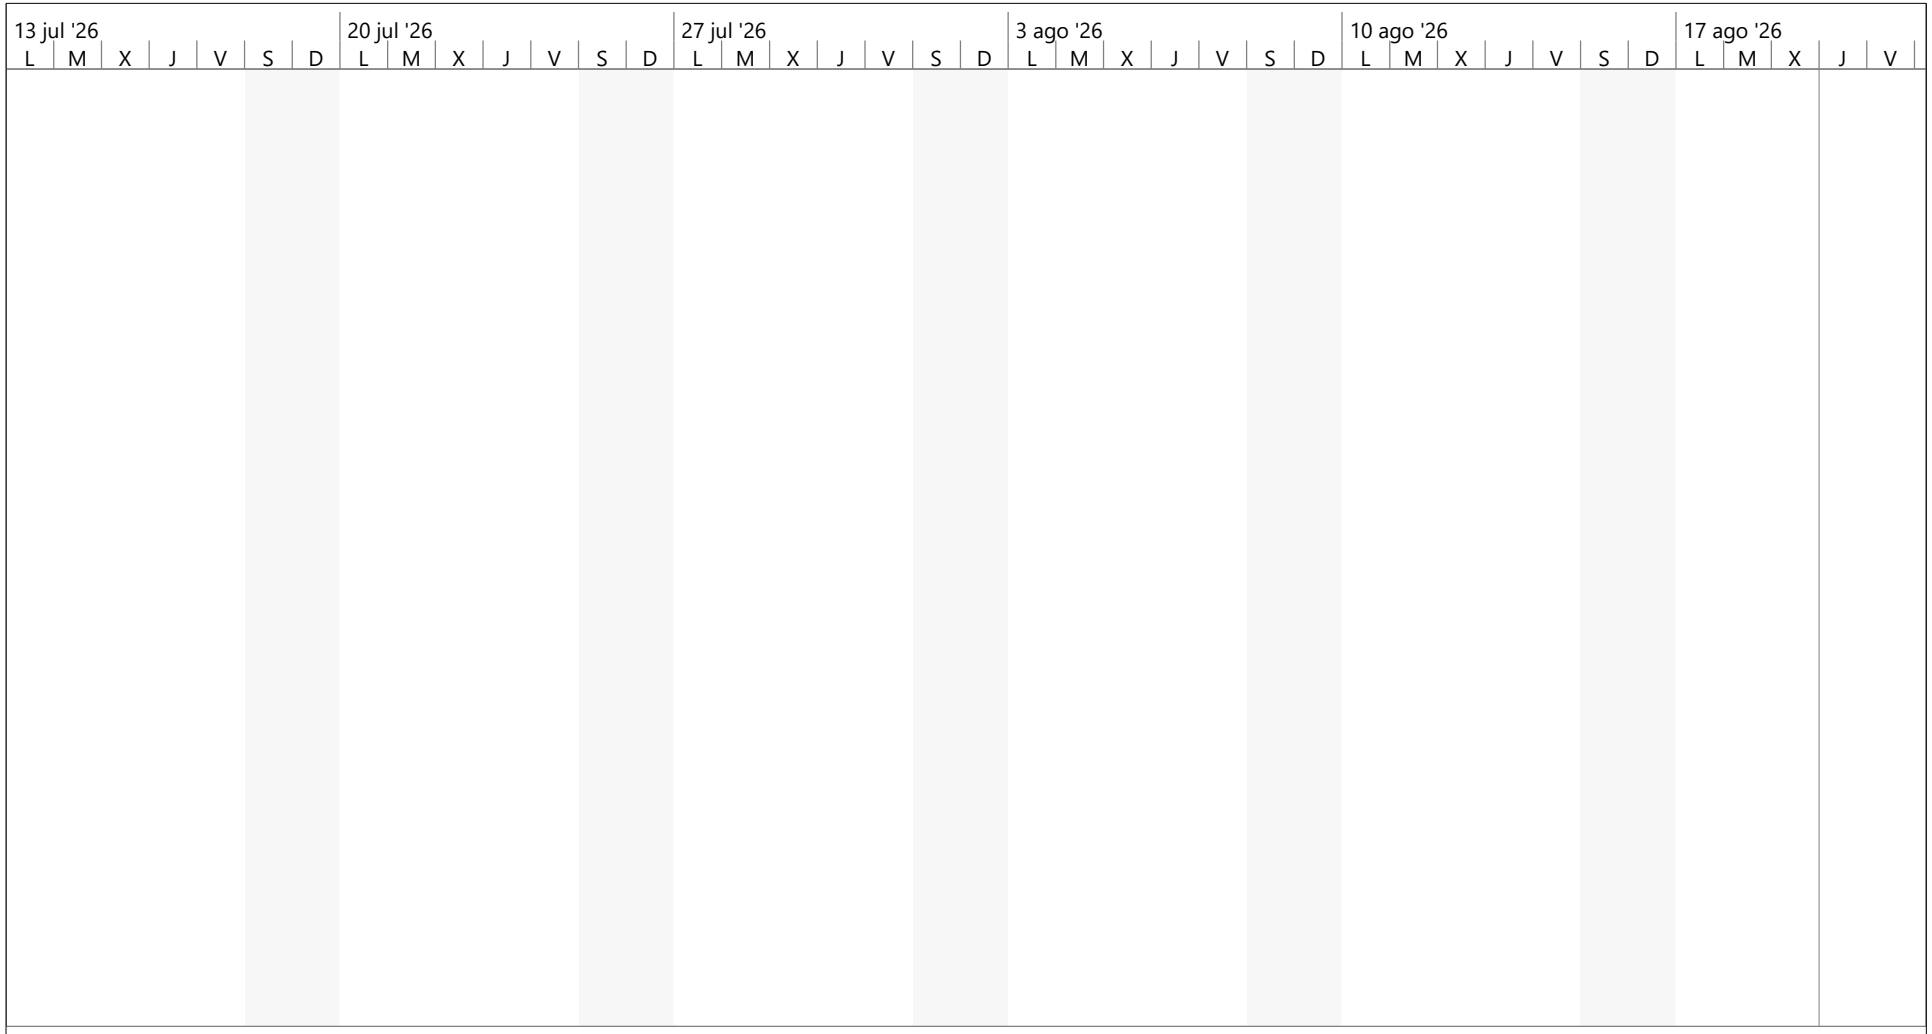

Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Cronograma de Activ
Fecha: mié 15/4/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			
